




FINANZ CAMPUS

Bau-News der Kasseler Sparkasse

APRIL 2023 - AUSGABE 11

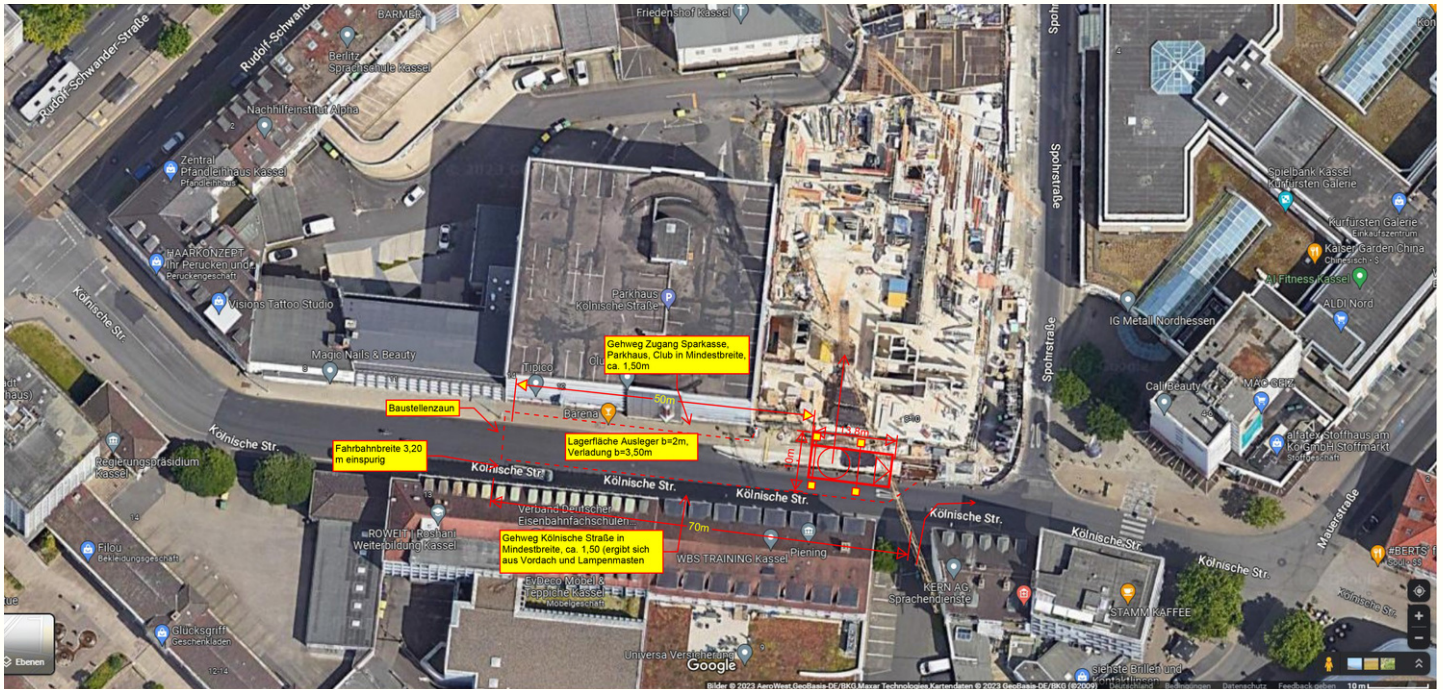

Liebe Anwohnerinnen, liebe Anwohner,

die Rohbauarbeiten für unseren S-Finanz-Campus sind nahezu abgeschlossen und deswegen kann nun auch der letzte verbliebene Kran am 27. und 28. April abgebaut werden. Dabei wird es nur zu wenigen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Für den Fahrzeugverkehr ist wie gewohnt nur eine Fahrspur stadteinwärts in der Kölnischen Straße befahrbar. Der Busverkehr wird von der Mauerstraße kommend über die Spohrstraße geführt. Das Parkhaus Kölnische Straße 12-14 ist zu erreichen. Lediglich die Fußgängerinnen und Fußgänger werden um die gesicherte Verladestelle geführt. Wir bitten Sie um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen. Sollten Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie sich gerne an den auf Seite 3 angegebenen Kontakt wenden.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Geduld und Rücksichtnahme während dieser Baumaßnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Ingo Buchholz

Vorstandsvorsitzender Kasseler Sparkasse

GLASDACHMONTAGE

Die letzte Stahlbeton-Deckenplatte über dem 8. Obergeschoss konnte wie geplant noch vor Ostern betoniert werden und auch am Bauteil 1 sind wie bereits an Bauteil 2 schon wesentliche Teile der Fassade montiert.

In beiden Bauteilen und den Untergeschossen läuft der Ausbau auf Hochtouren. Dabei stehen vor allen Dingen die Trockenbau- und Putzarbeiten im Vordergrund. Auch mit den haustechnischen Anlagen geht es in großen Schritten voran.

Besonders spannend war die Montage des Glasdachs – die Bilder zeigen die einzelnen Schritte.




UNSERE WEB-CAMS

Verfolgen Sie live die Bauarbeiten aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Klicken Sie einfach unter

www.kasseler-sparkasse.de/s-finanz-campus

GLASDACHMONTAGE

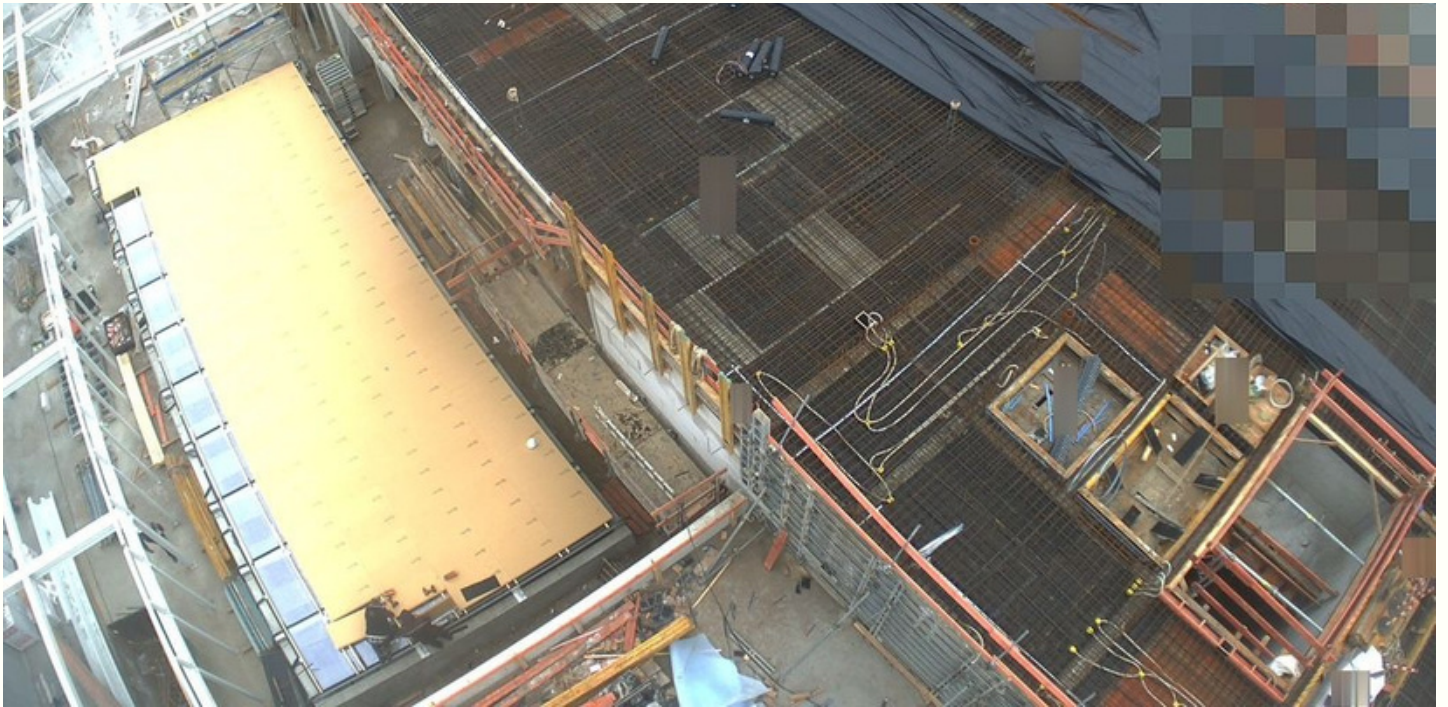

Damit während der noch anstehenden Baumaßnahmen nichts passiert, wurde das neue Glasdach zum Schutz erst einmal sicher eingepackt.

IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT

Notfallkontakt:
Firma Emmeluth
Jan Groeneveld
Telefon 0171-7520868

Bauherr: Kasseler Sparkasse
s-finanz-campus@kasseler-sparkasse.de
Oberbauleitung: ATELIER30 Architekten
Tel. 0561/50629020 | info@atelier30.de

WELCHE NÄCHSTEN SCHRITTE LIEGEN AN?

In den kommenden Wochen wird insbesondere weiter an der Fassade gearbeitet und schon bald wird unser S-Finanz-Campus von außen bereits seine Gebäudehülle im fertigen Zustand präsentieren können.

An Bauteil 2 ist im Bereich des Staffelgeschosses bereits die Glasbrüstung der Dachterrasse zu erkennen.

Im Innenausbau werden weiter fleißig Kabel gezogen, Lüftungskanäle und sanitäre Installationen hergestellt. Außerdem wird überall bereits verputzt und gemalert. Die Estricharbeiten laufen wie geplant. Als nächstes folgt der Einbau der Türen. Wenn das geschafft ist, geht es mit den fertigen Oberflächen weiter: Dann beginnen die Arbeiten an den Bodenbelägen und Wandoberflächen.

Unsere Bilder geben einen Vorgeschmack auf die fertige Fassade.



NEWSLETTER UND IMPRESSUM

Gern senden wir Ihnen unseren Bau-Newsletter auch digital zu. Schicken Sie dazu einfach eine kurze E-Mail an presse@kasseler-sparkasse.de

Kasseler Sparkasse
Wolfsschlucht 9, 34117 Kassel
Redaktion: Thomas Tripp, Katrin Westphal
s-finanz-campus@kasseler-sparkasse.de
